

ACUSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1577/2024

San Quintín, Baja California, a 06 de agosto del año 2024.
DR – 236 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE **CMFSQ**
RECIBIDO
2:43 pm
06 AGO 2024
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 1 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-008-24 por la cantidad de \$246,859.17 m.n. del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, para la obra denominada: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA


ATENTAMENTE



ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA.

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN 2020-2024
RECIBIDO
06 AGO. 2024
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

PRIMERO
San Quintín



Consejo Municipal Fundamental de San Quintín 2029-2032

07 de Agosto del 2024

05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA

Solicitud de pago por la estimación No. 1, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-008-24, por concepto de CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C

\$246,859.17

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	003	05000	372	01	61201	\$ 246,859.17
					TOTAL	\$ 246,859.17



Código(s) validados

[illegible]

Autorizó

PRIMERO
San Quintin

 Calle Primera s/n Fraccionamiento
Ciudad de San Quintín, Municipio
de San Quintín B.C., C.P. 22930

 Concejo Municipal Fundacional
de San Quintin

<https://www.sanquintin.gob.mx/>



COBA, CONSTRUCCION Y BACHEO
CCB220318UJ4

DATIL N° Ext.24951 N° Int.SIN NUMERO Col.EL FLORIDO III
CP.22237, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, México

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 32
Lugar de expedición: 22237
Fecha comprobante: 2024-08-06T11:00:23
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

RFC: MSQ200227D6A

Domicilio fiscal: 22940

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
-----------	----------	------------	-------------	-----------------	---------

73121602	1	E48 - Unidad de	ESTIMACION 1: DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SAENZ, LOCALIDAD SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. NO. CONTRATO SPMI-FAISMUN-LP-008-24	326,533.30	326,533.30
----------	---	-----------------	---	------------	------------

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-06T12:03:06

Folio fiscal:

0927EC34-C3D5-4398-BEC2-4AA22B8FD07E

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000513721194

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

000010000000702693654

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0927EC34-C3D5-4398-BEC2-4AA22B8FD07E|2024-08-06T12:03:06|TSP080724QW6|0ca9L3rDpQB/CP7Jowd65sSR68PM/BHP+z8rANLZYw
u4p6wYtYjXY+SXu0gWRicizG6jpoVU+ISSYIMc4mE9y0c22273LzHbamWsfXEJdT4pJH8ayYOHCF6dJURt2zXUslbJS+rqdJrBBq633YzWd4JF
pAV/3VTm8ZUjPPD626MxVJX688NznJOLBA5EbcAJWJ5CQ81MLnhekYgWbUf7vzZ5ZmFUI5k49IRY1tEkEqACJ998SDXxdXGQZNEsSYK
g+IzXtYHUKdGDsPFI6R34zTYPZCYHkC9IBDzHxPqGIZ5vzZiqhdtBI8A==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

0ca9L3rDpQB/CP7Jowd65sSR68PM/BHP+z8rANLZYw4p6wYtYjXY+SXu0gWRicizG6jpoVU+ISSYIMc4mE9y0c22273LzHbamWsfXEJdT4pJH8ayYOHCF6dJURt2zXUslbJS+rqdJrBBq633YzWd4JFpAV/3VTm8ZUjPPD626MxVJX688NznJOLBA5EbcAJWJ5CQ81MLnhekYgWbUf7vzZ5ZmFUI5k49IRY1tEkEqACJ998SDXxdXGQZNEsSYK+IzXtYHUKdGDsPFI6R34zTYPZCYHkC9IBDzHxPqGIZ5vzZiqhdtBI8A==

Sello digital del SAT:

QOCdIQHqC2aYpmlkHmYmUsgHLu+Bx6M1FRwLpU17ZD4pJ5pNbzWS36C-c8U4XsLJP1pXUj6XnwPb/dLQI3WAWMXqsc75vdcBGU3hC6j+JWYXgCwGq
hSe0mnbwXg5cX3n7G8gWKG485V/Ci+KwJLz8DcEC8U9KGMN7o4H3CnHjqtY8lC28u427Q8dEZccJ8cTAlLqIZHvnt0A59mQ8LrlnWaeCfH8YmCpMagjP8Xna
mQlwy6p3xkNCIbc0wPKF15Ug2zGfG C8HwUaBq5Zk4zWro07JLUGdElndRmp74HM7o68Uahm8IBLQ==

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SAENZ, LOCALIDAD SAN QUINTIN, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C. NO. CONTRATO SPMI-FAISMUN-LP-008-24

ESTIMACION 1: \$326,533.30

AMOTIZACIÓN 30%: \$97,959.99

SUB-TOTAL: \$228,573.31

IVA 8%: \$18,285.86

TOTAL: \$246,859.17

Subtotal	326,533.30
Descuento	97,959.99
IVA (8) %	18,285.86
Total	246,859.17



CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.	1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA: 1 DE: 3	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			PERIODO DEL:	
				10 DE JUNIO DE 2024	
				AL:	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
FECHA DE INICIO:				FECHA DE ESTIMACION	10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:				FECHA DE CONVENIO:	
CONVENIO No.					

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS			DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO	I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	ANTICIPO ESTIMACION 1	A	B		C=A-B	D=C*8%	E=C+D
		\$274,917.07	\$0.00		\$274,917.07	\$21,993.37	\$296,910.44
		\$326,533.30	\$97,959.99		\$228,573.31	\$18,285.86	\$246,859.17
SUMA:		\$326,533.30	\$97,959.99	\$0.00	\$503,490.38	\$40,279.23	\$543,769.61

LUGAR:

SAN QUINTÍN, B.C. D/A 10 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS


ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
EN INFRAESTRUCTURA


ARQ. BRENDA GISEL VILA CÁRDENAS



CARATULA DE ESTIMACION

CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.

ARQ. BRENDA GISEL VELA CÁRDENAS

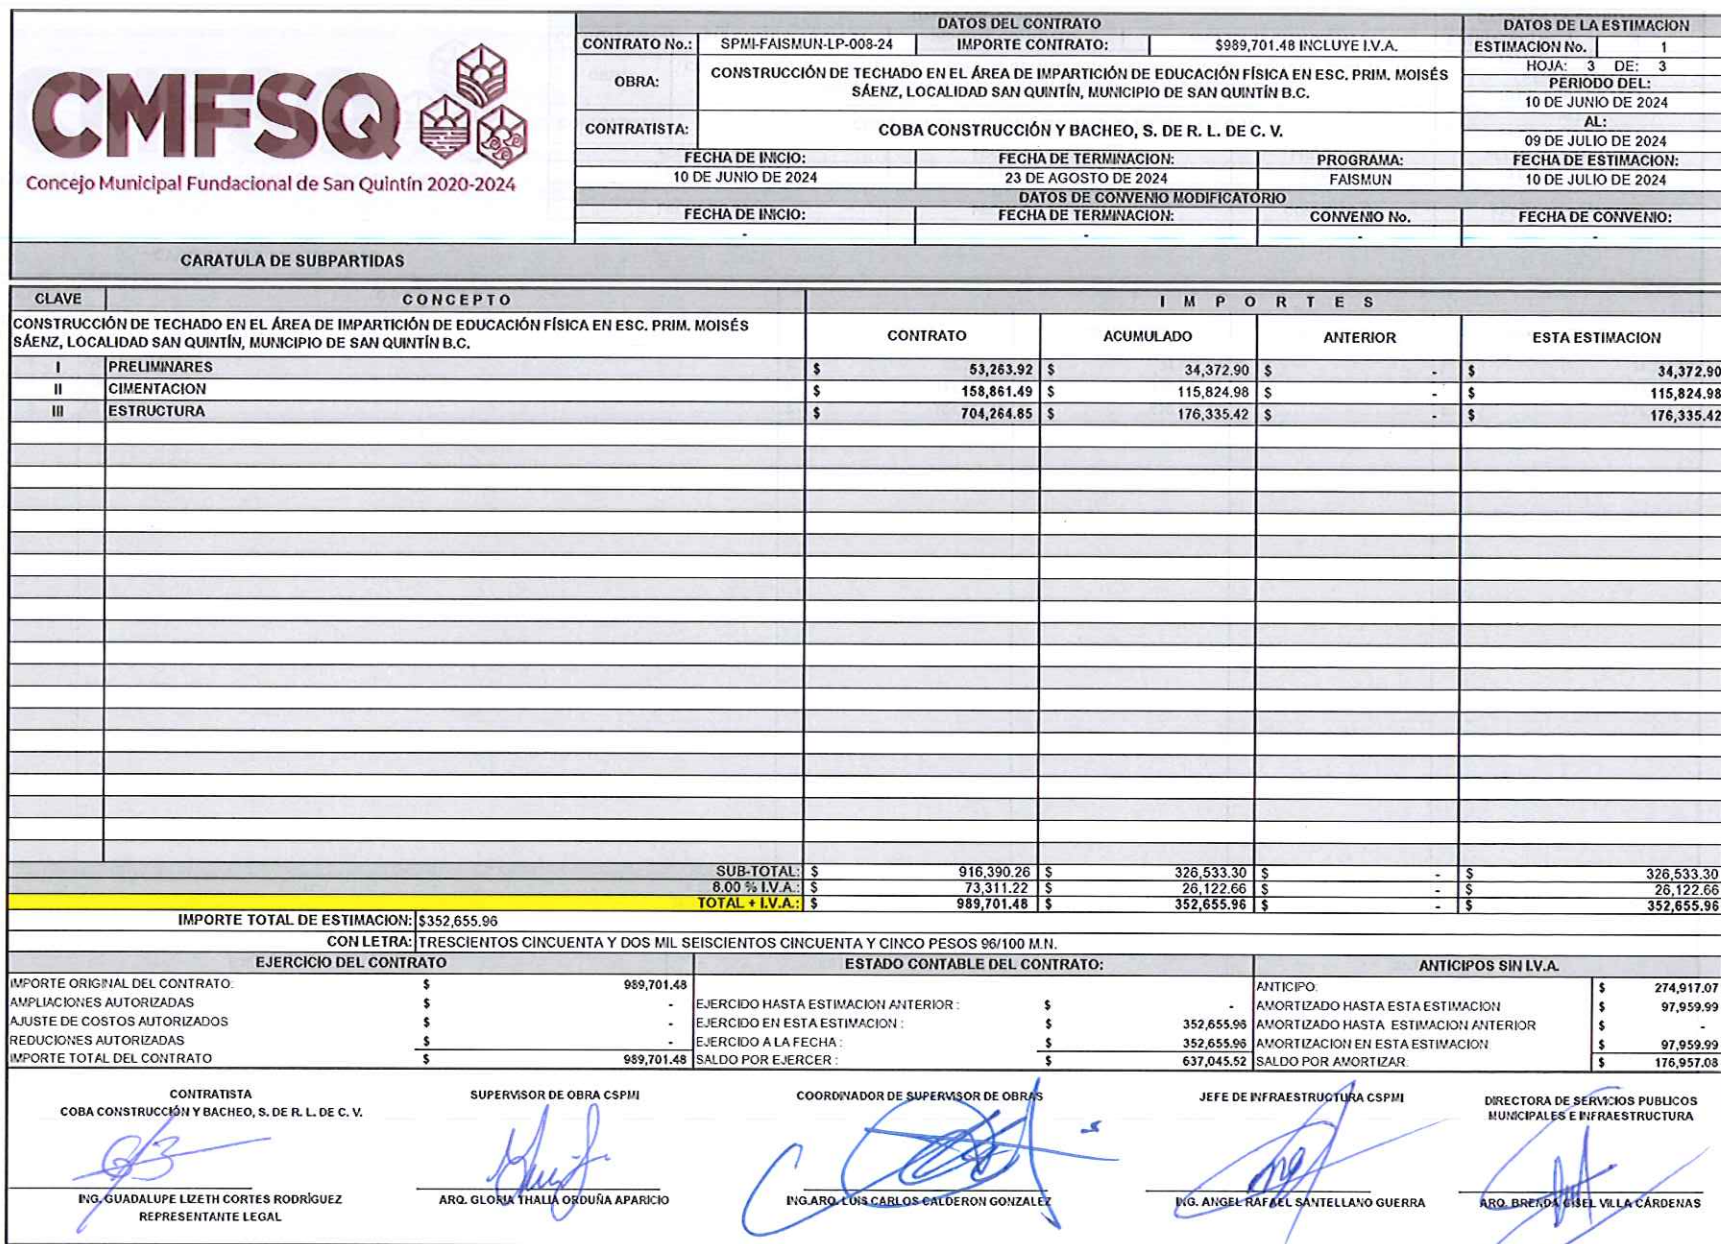



Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL :	
				10 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	
				09 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION
				FAISMUN	10 DE JULIO DE 2024
DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO					
FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		CONVENIO No.	FECHA DE CONVENIO:

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I	PRELIMINARES							\$	34,372.90
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo, tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de mureta).	PZA.	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 14,715.79	\$ -	0.00%
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrolaje). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	95.20	82.06	0.00	13.14	\$ 317.75	\$ 26,074.57	86.20%
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveletas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	478.29	478.29	0.00	0.00	\$ 17.35	\$ 8,298.33	100.00%
II	CIMENTACION							\$	115,824.98
II.01	Demolición de firme de espesor variable, a mano con marro, incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio. Retiro de material producto de la excavación, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	38.88	38.88	0.00	0.00	\$ 102.55	\$ 3,987.14	100.00%
II.02	Excavación a mano en material tipo "b", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	40.80	27.64	0.00	13.16	\$ 196.69	\$ 5,436.51	67.75%
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	32.30	19.34	0.00	12.96	\$ 106.22	\$ 2,054.29	59.88%
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	25.23	23.52	0.00	1.71	\$ 349.88	\$ 8,229.18	93.22%
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagROUT o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.20	0.00	0.00	0.20	\$ 68,056.56	\$ -	0.00%
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, fy= 4200 kg/cm2, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	805.94	764.04	0.00	41.90	\$ 57.98	\$ 44,299.22	94.80%
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm², en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreos, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	7.32	7.32	0.00	0.00	\$ 4,905.05	\$ 35,904.97	100.00%
II.08	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	52.80	51.84	0.00	0.96	\$ 34.44	\$ 1,785.37	98.18%
II.09	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	31.20	31.20	0.00	0.00	\$ 452.83	\$ 14,128.30	100.00%
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado,	M2	36.96	0.00	0.00	36.96	\$ 606.05	\$ -	0.00%

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

ARO. GLORIA THALIA ORDOÑA APARICIO

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARO. BRENDA GISEL VELA CÁRDENAS

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024		DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION	
		CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-008-24	IMPORTE CONTRATO:	\$989,701.48 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.: 1
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. MOISÉS SÁENZ, LOCALIDAD SAN QUINTÍN, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			PERIODO DEL : 10 DE JUNIO DE 2024
		CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL: 09 DE JULIO DE 2024
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA: FAISMUN
		FECHA DE INICIO:	-	FECHA DE TERMINACION:	-	CONVENIO No.:
		DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO			FECHA DE CONVENIO:	

DESGLASADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
	DESCRIPCION		SEGUN PROYECTO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	

III

ESTRUCTURA

\$ 176,335.42

III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 8mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,655.46	1,327.68	0.00	1,327.78	\$ 60.98	\$ 80,961.93	50.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	2,176.45	0.00	0.00	2,176.45	\$ 60.98	\$ -	0.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, ángulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	295.69	0.00	0.00	295.69	\$ 60.98	\$ -	0.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 6x6x1/4", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,240.13	1,240.13	0.00	0.00	\$ 60.97	\$ 75,610.73	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	548.00	0.00	0.00	548.00	\$ 60.97	\$ -	0.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 3x3x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,213.44	0.00	0.00	1,213.44	\$ 60.97	\$ -	0.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.52	0.00	0.00	139.52	\$ 60.97	\$ -	0.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	48.00	0.00	0.00	\$ 322.13	\$ 15,462.24	100.00%
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	70.27	70.27	0.00	0.00	\$ 61.20	\$ 4,300.52	100.00%
III.10	Suministro y colocación de lámina zincro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	414.45	0.00	0.00	414.45	\$ 326.40	\$ -	0.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.70	0.00	0.00	30.70	\$ 281.75	\$ -	0.00%
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	61.40	0.00	0.00	61.40	\$ 592.55	\$ -	0.00%

SUBTOTAL	\$ 326,533.30
IVA 8.00%	\$ 26,122.66
TOTAL + I.V.A.:	\$ 352,655.96

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

ARO. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARO. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
