



**DEPENDENCIA: PRIMER AYUNTAMIENTO DE
SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/0784/2024**

San Quintín, Baja California, a 28 de noviembre del año 2024.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

**MBA. FRANCISCO GEOVANY VALDEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:**

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago a **Coba Construcción y Bacheo, S. DE R.L. DE C.V.** por la estimación No. 4 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-012-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, con un importe de: **\$ 31,495.95** para la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.,** se anexan copias de los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura
- Se Anexa copia del Convenio Adicional que ampara los cambios efectuados en esta estimación

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.



**I AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN
2024-2027**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

ATENTAMENTE

**RAO. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**





Fecha de la solicitud:

28 de noviembre del 2024

Unidad Administrativa:

05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 4, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-012-24, por concepto de Construcción de techado en el área de impartición de educación física en Preparatoria Cobach, del Municipio de San Quintín.

Importe total de la solicitud:

\$ 31,495.95

Código(s)

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	003	05000	372	03	61201	\$ 31,495.95
					TOTAL	\$ 31,495.95

Firma del solicitante:

A llenarse por la Dirección de Administración y Finanzas

Código(s) validados

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe	FF

Elaboró

Autorizó





COBA, CONSTRUCCION Y BACHEO
CCB220318UI4

DATIL N° Ext.24951 N° Int.SIN NUMERO Col.EL FLORIDO III
CP.22237,TIJUANA,BAJA CALIFORNIA,México
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

No. Comprobante: 55
Lugar de expedición: 22237
Fecha comprobante: 2024-11-19T11:16:02
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

RFC: MSQ200227D6A

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 22940

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
73121602	1	E48 - Unidad de	ESTIMACION 4 FINQUITO: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C	29,162.92	29,162.92

Subtotal	29,162.92
Descuento	
IVA (8) %	2,333.03
Total	31,495.95

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-19T13:14:32

Folio fiscal: 1B31A7FE-11AF-4DE4-A87A-E06F9799811C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000513721194

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|1B31A7FE-11AF-4DE4-A87A-E06F9799811C|2024-11-19T13:14:32|TSP080724QW6|110ysDh3ZZxTY/0B5UHwGJ/abyAseplyZyriB09HHr1L+BiBo/pfcZPVGPRjB8Mu67knG9xC9NWsR7fms0L6ts8CHulrEH0YIOY/F3KelP012ECAwAULA6UDArRBDw1V2BkrQ1zdYs/2L0JG8ow2TyyA65XbpBli6EAOIH8kD3Ww0KuZzLwMJOBKezqDbnq3kwdG+C9NeyLVM9XTyFUqxBiJk9Wagvca+WdWd7ufrMSBLN9uBHUp3dUQuRZnQuclSx2N4nlyWBQE/UeVu9B06BXsSqxHP2U+utHgBK+UAcPUdLcS0KThypgAzHF6QUolndeQx5134Q==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

110ysDh3ZZxTY/0B5UHwGJ/abyAseplyZyriB09HHr1L+BiBo/pfcZPVGPRjB8Mu67knG9xC9NWsR7fms0L6ts8CHulrEH0YIOY/F3KelP012ECAwAULA6UDArRBDw1V2BkrQ1zdYs/2L0JG8ow2TyyA65XbpBli6EAOIH8kD3Ww0KuZzLwMJOBKezqDbnq3kwdG+C9NeyLVM9XTyFUqxBiJk9Wagvca+WdWd7ufrMSBLN9uBHUp3dUQuRZnQuclSx2N4nlyWBQE/UeVu9B06BXsSqxHP2U+utHgBK+UAcPUdLcS0KThypgAzHF6QUolndeQx5134Q==

Sello digital del SAT:

XAFvSNPChB61108P3V+jKlqHHMFv++5/2Nw4IL7oaHJur9qXnj3wM/hsqZq1jQm8SqWqvwq3EWE5jHUMYK0V2AUTQDD9JlH1IGbNKDTzjOw+PlsW+JlJEN8L0ImfUfXa s6/OzWqQEcLwU7u2sPKVmBXEreWF01GRI3Z0PMpuLgrIC2xSD4N3LP9OozjMjIFIKHHoGV9TyrSfMaaZoEk+IkZuNB09TWSOdyae+OkUQXbYI15UXEYAAAI+5a6v dJqaY2wbMOMHiaopr13mLKNKzrEmOBER9VksC24INuP3bTWwj5HY+Xg4VSqrjs/IVQMxnqJDSY8LIM7g==



Emisido por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

CONTRATO No.:

SPMI-FAISMUN-LP-012-24

IMPORTE CONTRATO:

\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.

ESTIMACION No.:

1 DE 3

PERIODO DEL:

27 DE AGOSTO DE 2024

AL:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE ESTIMACION:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE CONVENIO:

11 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C

CONTRATISTA:

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

FECHA DE INICIO:

23 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIO:

10 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

15 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO No.:

1

CONVENIO ADICIONAL

CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (61 días Naturales)

DESCRIPCION

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS

ORIGEN

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALU, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C

ANTICIPO
ESTIMACION 1
ESTIMACION 2
ESTIMACION 3
(CONVENIO MODIFICATORIO)
ESTIMACION 4
(CONVENIO ADICIONAL)

A
\$395,032.10
\$572,591.10
\$335,645.66
\$405,693.21

\$31,016.03

DEDUCCIONES

ANTICIPO

B
\$0.00
\$171,777.33
\$100,693.70
\$121,707.96

\$1,853.11

MULTA

SUB TOTAL LIQUIDO

C=A-B
\$395,032.10
\$400,813.77
\$234,951.96
\$283,985.25

\$28,162.92

I.V.A. (%)

D=C*8%
\$31,682.57
\$32,065.10
\$18,796.16
\$22,718.82

\$2,333.03

TOTAL PAGADO

E=C+D
\$427,714.67
\$432,878.87
\$253,748.12
\$306,704.07

\$31,495.95

SUMAR:

\$1,740,978.10

SAN QUINTIN, B.C. DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

LUGAR:

\$1,425,715.56

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZETH GONZALEZ RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS


ING. CARLOS CALDERON GONZALEZ


JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SATELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ARQ. BRENDA GRIEL VALLA CARDENAS

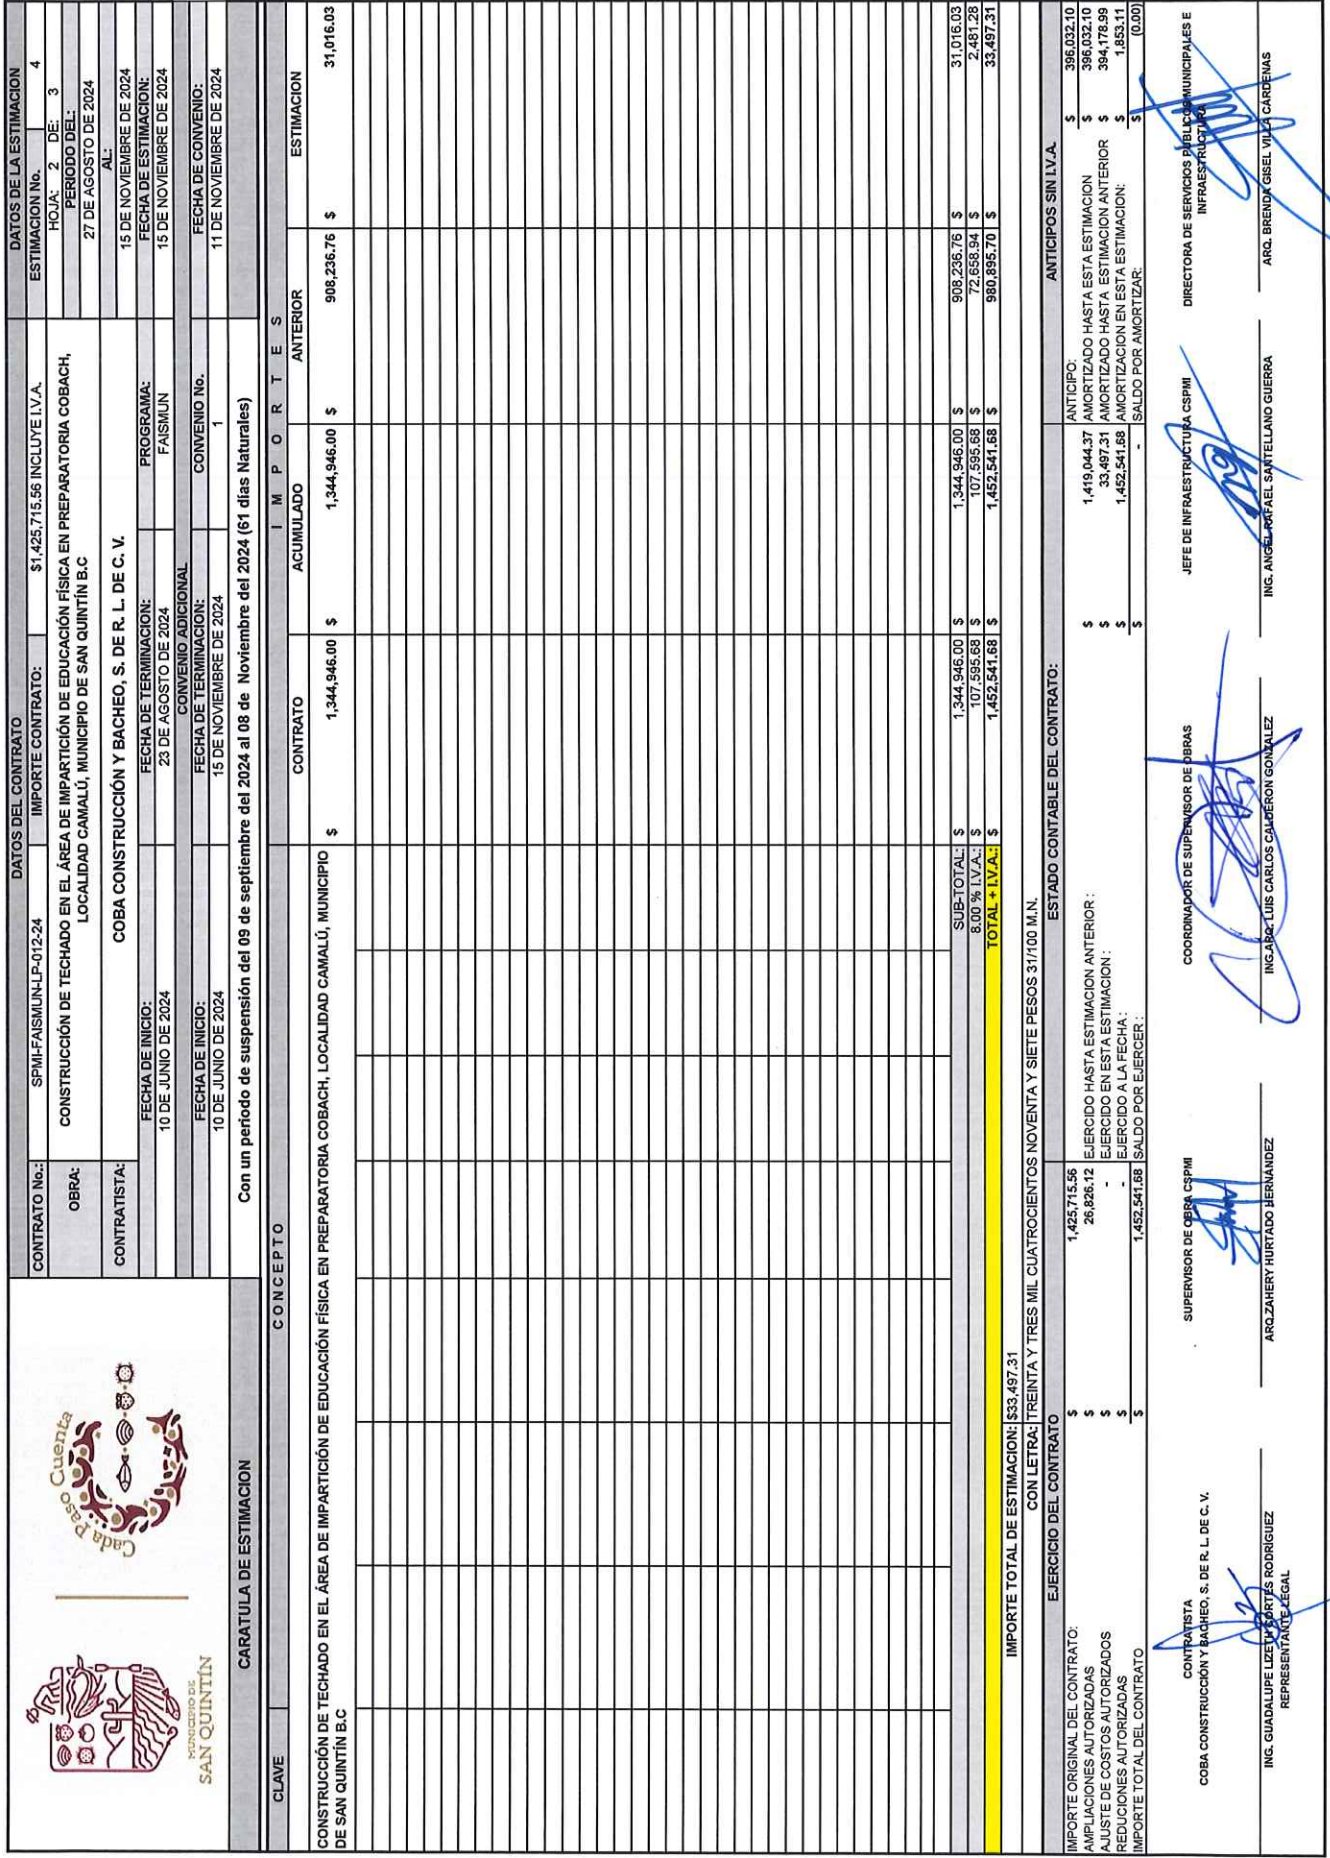

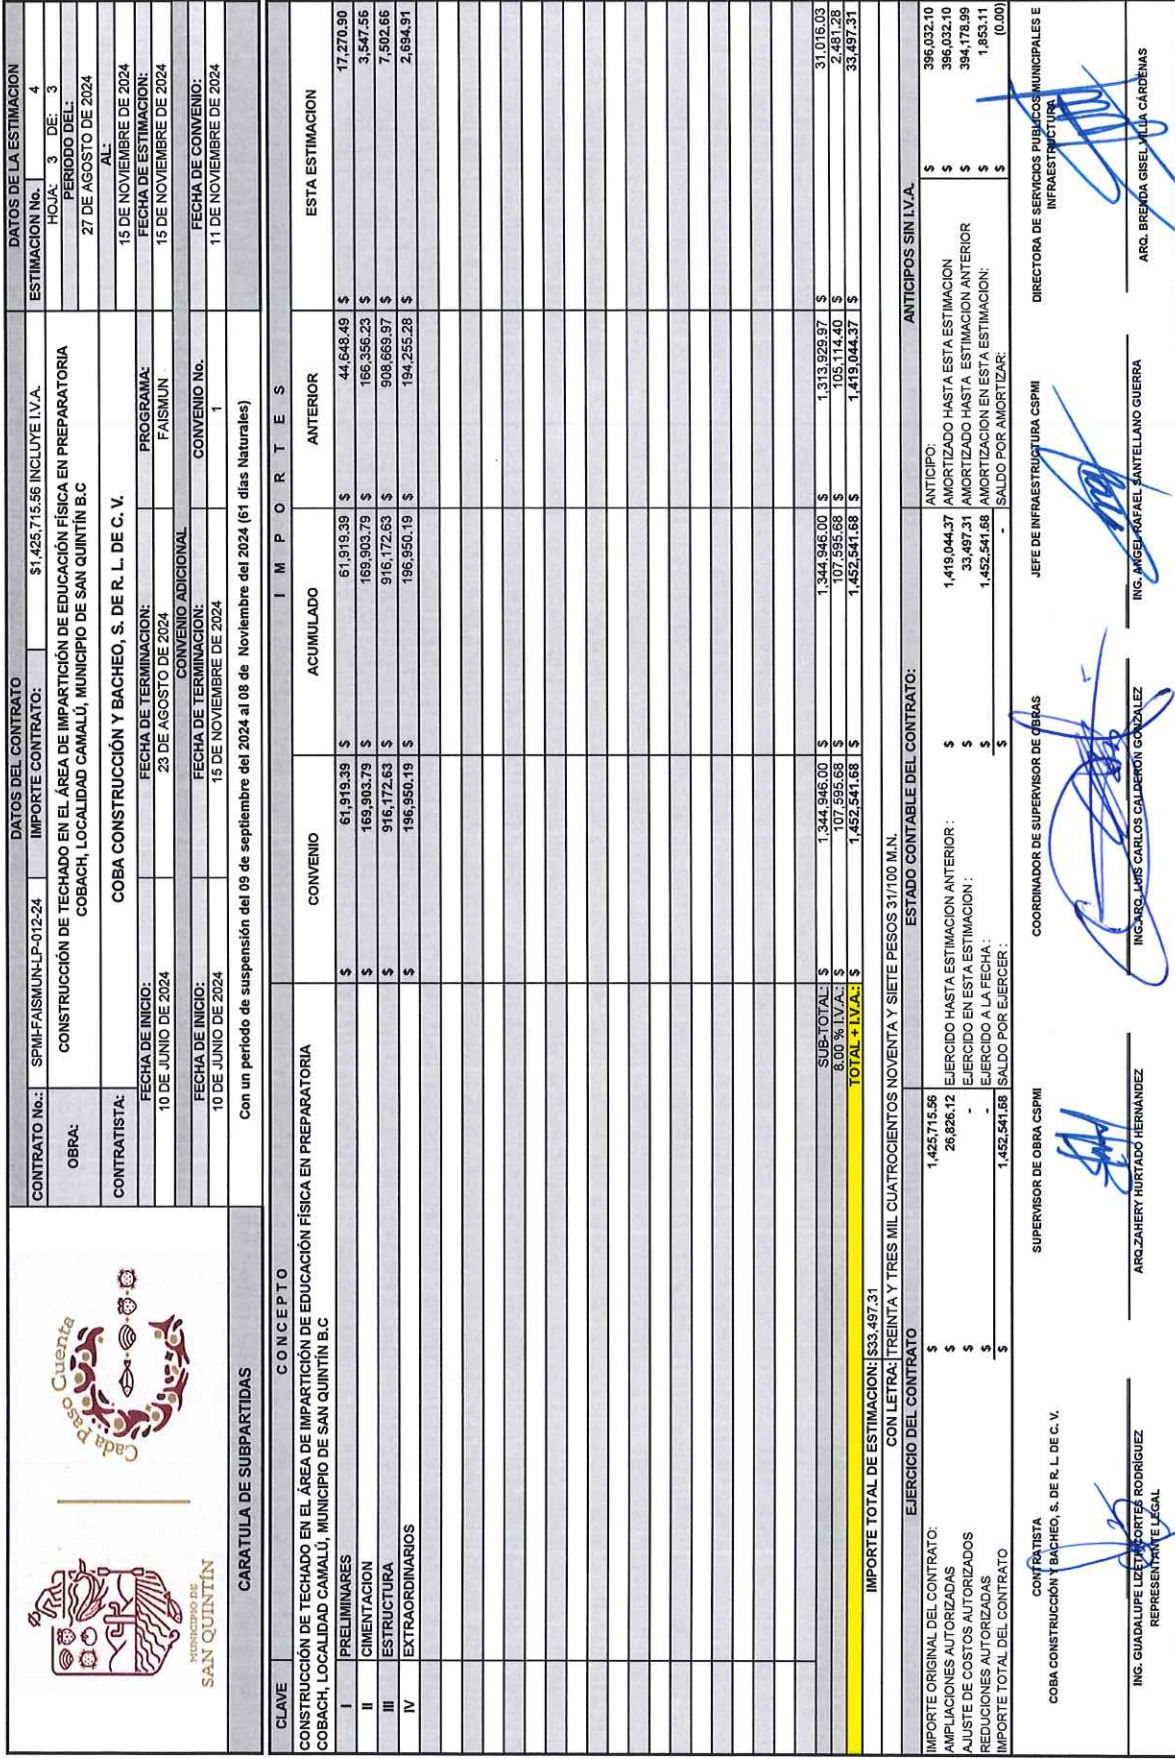

 Cada Paso Cuenta GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÁN		DATOS DEL CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACION					
		CONTRATO No.:	SPM-FASIMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4		
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÁN B.C				PERIODO DEL:	27 DE AGOSTO DE 2024	
		CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.				AL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
DESGLOSADO		FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:		PROGRAMA:	FECHA DE ESTIMACION			
		10 DE JUNIO DE 2024	23 DE AGOSTO DE 2024		FASIMUN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
		FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:		CONVENIO ADICIONAL	CONVENIO No.			
		10 DE JUNIO DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024		1	11 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Con un periodo de suspensión del 09 de septiembre del 2024 al 08 de Noviembre del 2024 (61 días Naturales)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
PRELIMINARES									
I								\$	17,270.90
L01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.60 m de largo. tipografía y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4", corte con láser para grabado de tipografía, chapetones para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.80m de alto x 0.80 m de ancho acabado aparente, zapata 15x40x80 cm, sellador Aquasol o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ver detalle de muro en plano de murete).	PZA.	1.00	1.00	0.00	0.00	\$	14,996.98	100.00%
L02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pollo y plástico negro con barrido de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrido). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	117.83	7.03	110.80	0.00	\$	323.46	100.00%
L03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplante de cimentaciones medido a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: nivelistas, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	499.10	0.00	499.10	0.00	\$	17.65	100.00%
CIMENTACION									
II								\$	3,547.56
II.01	Demolición de firme de 10 cm de espesor con equipo mecánico. Incluye: mano de obra, acarreos, equipo, herramienta, acopio, retiro de material producto de la demolición al lugar fuera de la obra indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	15.50	0.00	15.50	0.00	\$	126.65	100.00%
II.02	Excavación a mano en material tipo "B", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3.	41.16	0.00	41.16	0.00	\$	222.48	100.00%
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	29.640	-0.008	29.648	0.00	\$	119.25	100.00%
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	34.68	0.00	34.68	0.00	\$	374.94	100.00%
II.05	Plantilla de concreto expansivo (embeco, slaggrout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	0.06	0.00	0.06	0.00	\$	69,279.53	100.00%
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, fy= 4200 kg/cm2, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	921.19	0.0056	921.1886	0.00	\$	60.91	100.00%
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2, en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreos, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	10.34	0.03	10.31	0.00	\$	5,164.94	100.00%
II.08	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	37.04	0.00	37.04	0.00	\$	460.97	100.00%
II.09	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	44.92	0.00	44.92	0.00	\$	43.12	100.00%
II.10	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.50	5.50	10.00	0.00	\$	616.95	100.00%
							\$	3,393.23	100.00%

CONTRATISTA
COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.
ING. GUADALUPE LIZET VARGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI
ARQ. ZAHERY HURTADO FERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA ESPMII
ING. ANGEL RAFAEL SANTELNAS GUERRA

  		DESGLOSADO										
CONCEPTO		UNIDAD		VOLUMENES			COSTOS		AVANCE FINANCIERO			
		SEGUN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
III		ESTRUCTURA										
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 12mt10c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	3,236.58	-3,236.58	3,236.58	3,236.58 \$	65.23 \$	-	0.00%		7,502.66	
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,949.22	0.00	1,949.22	0.00 \$	65.23 \$	-	100.00%			
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt12c, en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,258.20	0.00	1,258.20	0.00 \$	65.23 \$	-	100.00%			
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, traves o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	474.56	0.00	474.56	0.00 \$	64.97 \$	(0.01)	100.00%			
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de pfr. 8x8x5/16", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	2,866.64	0.00	2,866.64	0.00 \$	65.22 \$	-	100.00%			
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de pfr. 4x4x3/16", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	2,511.46	0.00	2,511.46	0.00 \$	65.22 \$	(0.01)	100.00%			
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de pfr. 2x2x1/8", en columnas y traves. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	154.16	0.00	154.16	0.00 \$	65.22 \$	-	100.00%			
III.08	Suministro y colocación de anclajes tipo L acero a-36 con rosca, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.00	0.00	48.00	0.00 \$	341.29 \$	-	100.00%			
III.09	Suministro y colocación de placas base, medidas indicadas en el plano. Incluye: habilitado, nivelación, tuercas, rondanas, soldadura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	184.20	0.0021	184.20	0.00 \$	62.31 \$	0.13	100.00%			
III.10	Suministro y colocación de lámina zinc R-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	624.00	19.21	604.79	0.00 \$	382.29 \$	7,343.79	100.00%			
III.11	Suministro y colocación de caballote incluye: tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.80	0.10	30.70	0.00 \$	320.50 \$	32.05	100.00%			
III.12	Suministro y colocación de canalera galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	61.60	0.20	61.40	0.00 \$	633.55 \$	126.71	100.00%			
										SUBTOTAL	\$	31,016.03
										IVA 8.00%	\$	2,481.28
										TOTAL + I.V.A.:	\$	33,497.31

CONTRATISTA

COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.

ING. GUADALUPE LIZET GARCÍA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JAHIER HURTADO HERNÁNDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA

ING. ANGEL RAFAEL SANTIAGO GUERRA

		DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION				
		CONTRATO No.:	SPM-FASMUN-LP-012-24	IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,425,715.56 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	4			
		OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C			PERIODO DEL :	27 DE AGOSTO DE 2024			
		CONTRATISTA:	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO, S. DE R. L. DE C. V.			AL:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE ESTIMACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
		FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE CONVENIO:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024			
		CONVENIO No. 1								
		Con un periodo de suspensión del 09 de septiembre del 2024 al 08 de Noviembre del 2024 (61 días Naturales)								
		DESGLOSADO								
		CONCEPTO		VOLUMENES		COSTOS				
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO	
